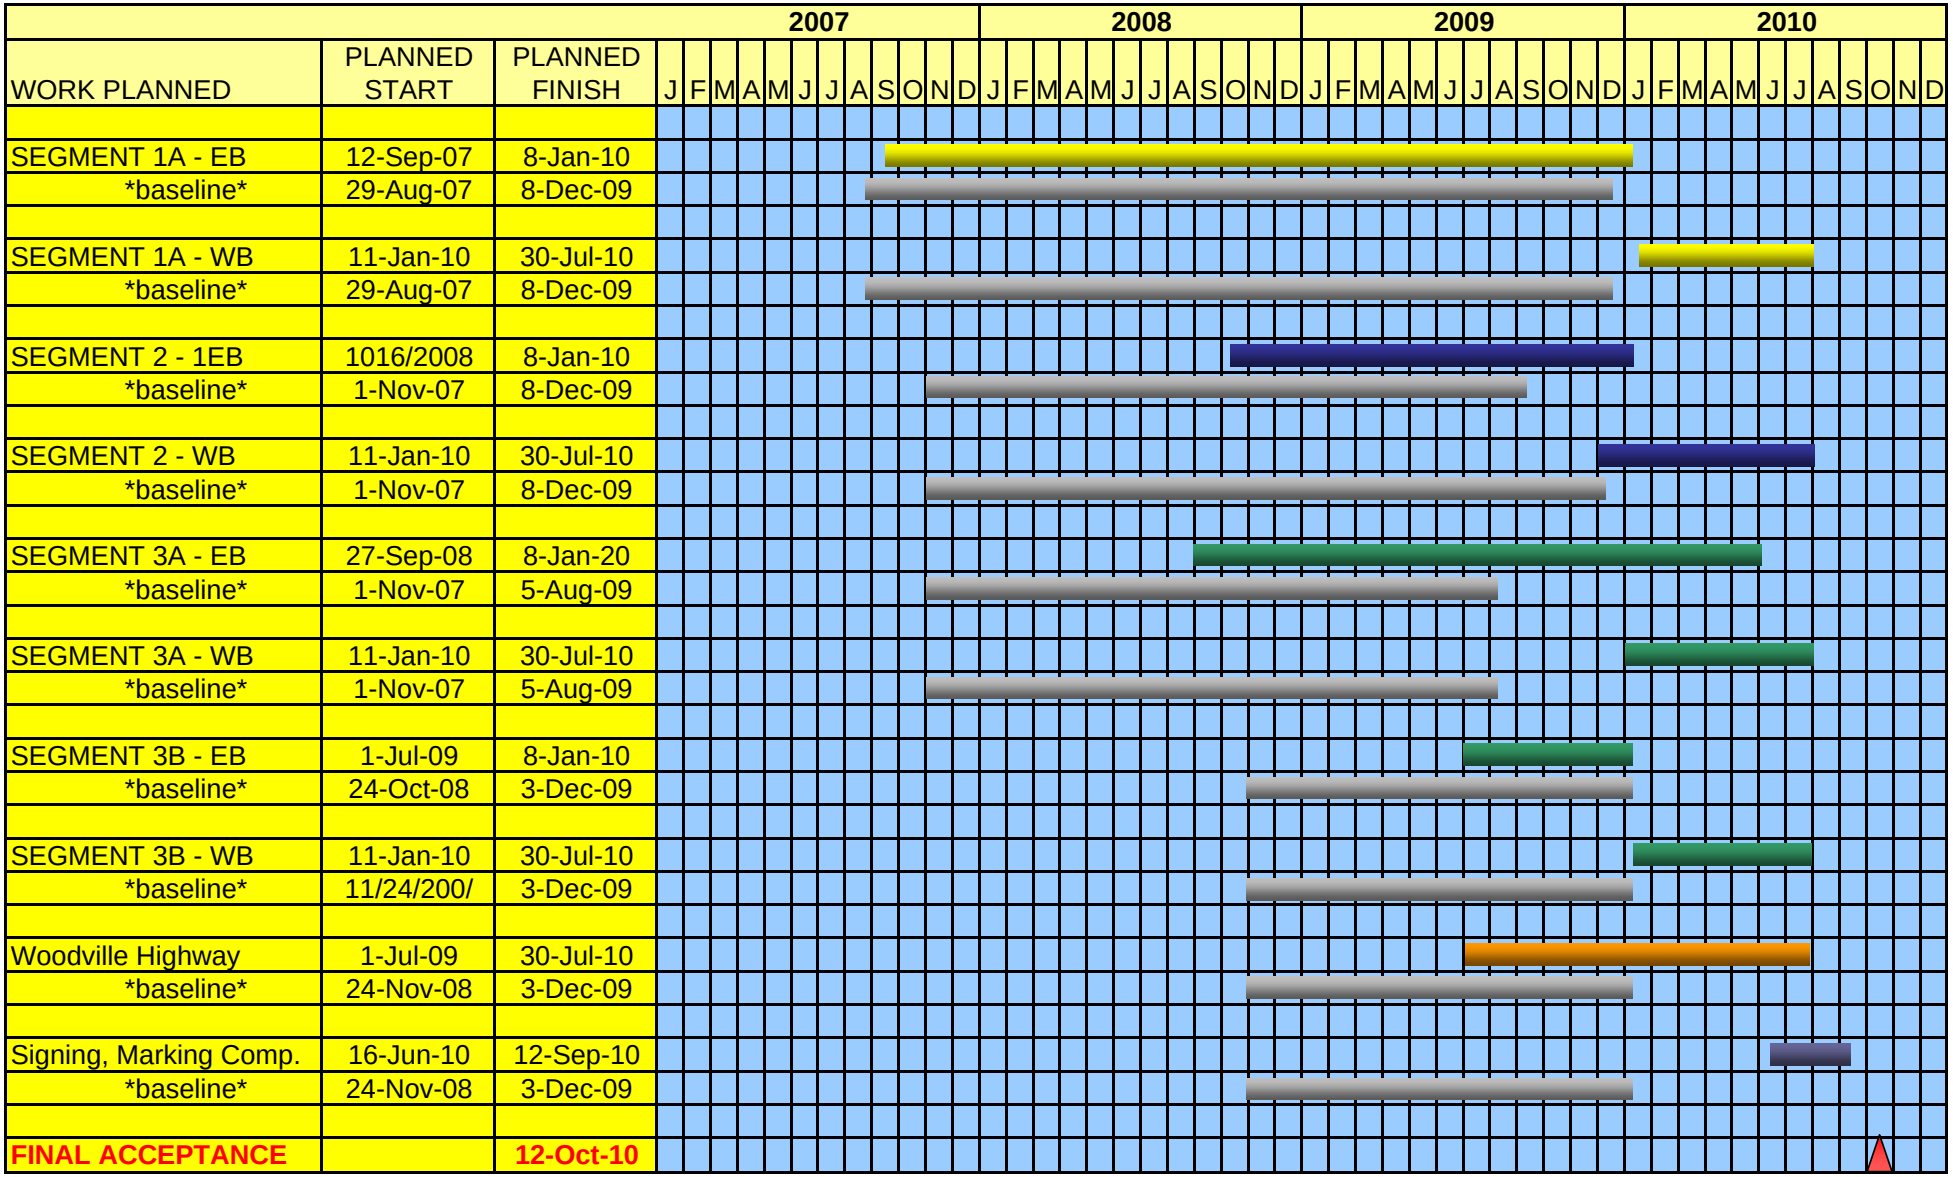

WORK PLANNED	PLANNED START	PLANNED FINISH
SEGMENT 1A - EB	12-Sep-07	8-Jan-10
baseline	29-Aug-07	8-Dec-09
SEGMENT 1A - WB	11-Jan-10	30-Jul-10
baseline	29-Aug-07	8-Dec-09
SEGMENT 2 - 1EB	1016/2008	8-Jan-10
baseline	1-Nov-07	8-Dec-09
SEGMENT 2 - WB	11-Jan-10	30-Jul-10
baseline	1-Nov-07	8-Dec-09
SEGMENT 3A - EB	27-Sep-08	8-Jan-20
baseline	1-Nov-07	5-Aug-09
SEGMENT 3A - WB	11-Jan-10	30-Jul-10
baseline	1-Nov-07	5-Aug-09
SEGMENT 3B - EB	1-Jul-09	8-Jan-10
baseline	24-Oct-08	3-Dec-09
SEGMENT 3B - WB	11-Jan-10	30-Jul-10
baseline	11/24/200/	3-Dec-09
Woodville Highway	1-Jul-09	30-Jul-10
baseline	24-Nov-08	3-Dec-09
Signing, Marking Comp.	16-Jun-10	12-Sep-10
baseline	24-Nov-08	3-Dec-09
FINAL ACCEPTANCE		**12-Oct-10**
